



# IVREA

## IN CORSO

### IL PUNTO SUI CANTIERI ●



**GIOVEDÌ 05/06**



**SALA SANTA MARTA**



**ORE 17:30**



# **IVREA**

## **IN CORSO**

### **IL PUNTO SUI CANTIERI ●**

#### **PREMESSE**

- **DOPO PIU' DI UN ANNO DAL LANCIO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "IVREA IN CORSO" SIAMO AL SECONDO INCONTRO DI AGGIORNAMENTO**
- **PER AIUTARE IL CITTADINO NELLA COMPrensIONE DELLE DINAMICHE DI QUESTI LAVORI, CI SIAMO POSTI L'OBIETTIVO DI SPIEGARE IN MODO SEMPLICE PROGETTI COMPLESSI COME I CANTIERI PNRR, E NON SOLO, ILLUSTRANDO SIA LE OPERE DI STRETTA COMPETENZA COMUNALE CHE QUELLI DI ALTRI ENTI COME RFI, ASL E SMAT**



# IL PUNTO SUI CANTIERI

## 01. ORTI URBANI

Rifunionalizzazione degli orti urbani comunali di Canton Vesco; bonifica dei siti e costituzione di comunità agricole nel rispetto della sostenibilità ambientale



- IL CANTIERE HA AVUTO INIZIO CON LA DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE PREESISTENTI
- SUCCESSIVAMENTE, SI È PROCEDUTO ALLA RIMOZIONE DELL'AMIANTO ETERNIT CHE ERA VISIBILE IN SUPERFICIE. UN PROFESSIONISTA INCARICATO HA CONDOTTO DELLE ANALISI SPECIFICHE PER VERIFICARE LA PRESENZA DI AMIANTO NEL TERRENO SOTTOSTANTE ALLE BARACCHE E, DOPO LA CONFERMA, HA ESAMINATO L'AREA INTERESSATA PER DETERMINARNE L'ESTENSIONE
- A CAUSA DI QUESTO IMPREVISTO ANDRANNO REPERITE LE RISORSE NECESSARIE CHE SI AGGIRANO SUI 250.000€. SIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DA PARTE DEL MINISTERO PER CAPIRE SE SI POSSA UTILIZZARE IL RIBASSO D'ASTA (COSA CHE NEL PNRR NON E' CONSENTITA SALVO IN CASI SPECIALI)
- I LAVORI SONO SOSPESI PER PRESENZA DI AMIANTO. INCARICATO UN PROFESSIONISTA PER LA BONIFICA CON AUTORIZZAZIONE CMTO. IN CORSO LA CAMPIONATURA PRELIMINARE DA PARTE DEL LABORATORIO ANALISI PER LA BONIFICA
- LE ATTIVITÀ SONO FUNZIONALI ALLA DEFINIZIONE DELLA VARIANTE E AL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO. LA DL RIFERISCE CHE L'IMPRESA HA ESEGUITO IL TAGLIO DELL'ERBA E SISTEMATO LE RETI DI CANTIERE PER L'AVVIO DELLE OPERAZIONI.



AVANZAMENTO LAVORI:



20%

INIZIO LAVORI: **19/01/2024**

FINANZIAMENTO PNRR: **€ 1.224.361,00**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA: **€ 608.530,75**



# IL PUNTO SUI CANTIERI

## 02. BASTIONI DEL CASTELLO

Rigenerazione funzionale delle aree verdi e dei bastioni esterni al centro storico di Ivrea per migliorare accessibilità e fruizione dei luoghi di aggregazione di comunità



- I LAVORI PER IL CANTIERE SONO INIZIATI CON L’AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CHE, DOPO AVER RICEVUTO UNA DIFFIDA, HA NOMINATO UN’ALTRA DELLE SUE CONSORZIATE PER OCCUPARSI DELLE ATTIVITÀ
- QUESTA NUOVA CONSORZIATA È ATTUALMENTE IN ATTESA DI VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE. A BREVE, PERÒ, È PREVISTO UN INCONTRO PER DISCUTERE LA RIORGANIZZAZIONE E L’AVVIO DEL PROGETTO
- NEL FRATTEMPO, SONO IN CORSO ANCHE ALCUNE PICCOLE VARIANTI RICHIESTE DALLA SOPRINTENDENZA
- APERTA LA BRECCIA VERSO LA “VIA NUOVA” SUPERIORE, E’ IN COSTRUZIONE LA SCALA, CON ULTIMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE IN CORSO. DURANTE I LAVORI SONO EMERSI REPERTI ARCHEOLOGICI; INCARICATA UN’ARCHEOLOGA CHE, CON LA SOPRINTENDENZA, STA DEFINENDO UN PIANO D’AZIONE. INDIVIDUATO PERCORSO ALTERNATIVO GRAZIE AD ACCORDI CON PRIVATI, PER BYPASSARE L’AREA DEGLI SCAVI. PREVISTA INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA SCALA A PARTIRE DAL 9 GIUGNO P.V.
- SI PROCEDERÀ A BREVE ANCHE ALLA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE DAI MURI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE



AVANZAMENTO LAVORI:



INIZIO LAVORI: **30/01/2024**

FINANZIAMENTO PNRR: **€ 1.350.000,00**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA: **€759.633,85**



# IL PUNTO SUI CANTIERI

## 03. ACCESSIBILITA' PUBBLICA


Oltre 60 interventi diffusi di mobilità sostenibile volti alla difesa delle utenze deboli con particolare riferimento alla eliminazione delle barriere architettoniche



- IL CANTIERE HA COME OBIETTIVO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CHE COMPRENDE IL RIFACIMENTO DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, L'AGGIUNTA DI PERCORSI TATTILI LOGES E RAMPE PER DISABILI
- GLI INTERVENTI DI QUESTO PROGETTO SONO ANCHE RELATIVI ALLA SICUREZZA STRADALE (ZONE 30)
- LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORI È GIÀ STATA COMPLETATA, TUTTAVIA, CAUSA LA NUMEROSITÀ' E LA COMPLESSITÀ' DEGLI INTERVENTI, IN QUESTI MESI SI SONO RESE NECESSARIE ALCUNE VARIANTI AL PROGETTO PER APPORTARE MODIFICHE O MIGLIORA
- TUTTI GLI INTERVENTI SONO CONCLUSI, COMPRESO "IVREA FACILE" (RACCONTO DI PERCORSI NON TURISTICI). GLI ASFALTI DI VIA AOSTA E PIAZZALE MASSIMO D'AZEGLIO SONO STATI ESEGUITI DALLA STESSA DITTA, SENZA NECESSITÀ DI ULTERIORI INTERVENTI.



AVANZAMENTO LAVORI:



INIZIO LAVORI: **29/01/2024**

FINE LAVORI: **17/03/2025**

FINANZIAMENTO PNRR: **€ 910.000,00**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA: **€ 565.140,00**



# IL PUNTO SUI CANTIERI

## 04. CASE DI QUARTIERE


Interventi di recupero funzionale delle case di quartiere di San Giovanni e Bellavista come luogo di incontro, aggregazione di presidio culturale e di cittadinanza attiva



- IL CANTIERE E' ATTINENTE AD INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DELLE CASE DI QUARTIERE DI SAN GIOVANNI E BELLAVISTA
- TERMINATI I LAVORI, SIAMO IN ATTESA DEL COLLAUDO FINALE
- **TERMINATO**



AVANZAMENTO LAVORI:



INIZIO LAVORI: **11/03/2024**

FINE LAVORI: **20/11/2024**

FINANZIAMENTO PNRR: **€ 345.000,00**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA:  
**€ 180.819,90**



# IL PUNTO SUI CANTIERI

## 05. PARCO POLVERIERA


Interventi per la fruizione sostenibile del parco della Polveriera e del Lago San Michele al fine del potenziamento della capacità inclusiva dell'area



- I LAVORI SONO CONSISTITI NELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PRESENTI NEL PARCO E IN ALCUNE SISTEMAZIONI ESTERNE COMPRESO IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E I BAGNI.
- LE OPERE SONO SOSTANZIALMENTE ULTIMATE E RIMANGONO DA SISTEMARE ALCUNI ELEMENTI DI DETTAGLIO (CANCELLO NORD, INTEGRAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI) PRIMA DI PROCEDERE AL COLLAUDO AMMINISTRATIVO
- **TERMINATO**



AVANZAMENTO LAVORI:



INIZIO LAVORI: **24/01/2024**

FINE LAVORI: **30/10/2024**

FINANZIAMENTO PNRR: **€ 300.000,00**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA:  
**€ 159.785,15**



# IL PUNTO SUI CANTIERI

## 06. CASE ATC IV MARTIRI


Miglioramento della qualità del decoro urbano, ristrutturazione edilizia finalizzata anche al risparmio energetico dell'edificio destinato a residenza sociale pubblica in via IV Martiri



- SONO INIZIATI I LAVORI SULLA FACCIATA PRINCIPALE E A BREVE SI PROCEDERÀ ALLA SOSTITUZIONE DI TUTTI I SERRAMENTI ESTERNI
- SONO GIÀ CONCLUSI IL RIFACIMENTO DEI VANI SCALA, IL POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI PER IL RISPARMIO ENERGETICO TRAMITE POMPA DI CALORE E IL RESTAURO DEI PORTONCINI DELLE ABITAZIONI
- **TERMINATO**



AVANZAMENTO LAVORI:



INIZIO LAVORI: **29/01/2024**

FINE LAVORI: **19/02/2025**

FINANZIAMENTO PNRR: **€ 870.000,00**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA:  
**€ 486.947,60**



# IL PUNTO SUI CANTIERI

## 07. CASE ATC MARSALA/OSPEDALE


Miglioramento della qualità del decoro urbano, ristrutturazione edilizia finalizzata anche al risparmio energetico dell'edificio destinato a residenza sociale pubblica in via Marsala/via Ospedale



- I LAVORI CONSISTONO NELLA: RELIZZAZIONE DEL CAPPOTTO ESTERNO, SOSTITUZIONE DI TUTTI I SERRAMENTI
- IL CANTIERE NECESSITAVA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA VARIANTE PRESENTATA IN GIUNTA IL 17/10/2024. LE MISURAZIONI DEGLI ALLOGGI SONO INIZIATE IL 10/10/2024
- LAVORI AVVIATI; IL CAPPOTTO ESTERNO È GIÀ STATO REALIZZATO
- SONO STATI MISURATI E ORDINATI TUTTI I SERRAMENTI ESTERNI CHE DOVREBBERO VENIRE POSATI A BREVE



AVANZAMENTO LAVORI:



INIZIO LAVORI: **15/11/2023**

FINANZIAMENTO PNC: **€ 1.450.000,00**

IIIMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA: **€ 807.198,50**




# IL PUNTO SUI CANTIERI

## 08. ASILO NIDO OLIVETTI

Lavori di restauro, risanamento conservativo e adeguamento normativo dell' Asilo Nido Olivetti

- IL CANTIERE VEDE DA POCO LA FIRMA DEL CONTRATTO CON LA DITTA DREMAR AFFIDATARIA DEI LAVORI A CAUSA DI UN RICORSO IN FASE DI PRIMA ASSEGNAZIONE E PER L'ACCENSIONE DI UN MUTUO DI 1.395.000€
- APPALTO INTEGRATO
- A BREVE CONSEGNERANNO L'ESECUTIVO CHE UNA VOLTA VALIDATO SARA' SEGUITO DALL'INIZIO LAVORI
- LAVORI AVVIATI CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLA STRUTTURA ALLE VISITE. COMPLETATE LE DEMOLIZIONI INIZIALI, È IN CORSO LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO.

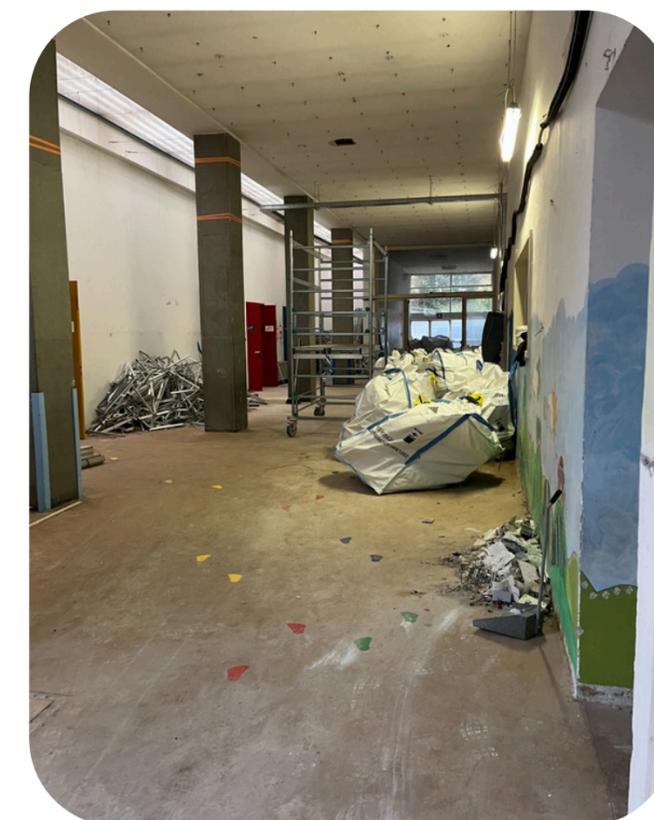

AVANZAMENTO LAVORI:



INIZIO LAVORI: **30/12/2024**

FINANZIAMENTO PNRR/FOI: **€ 3.011.485,45**

FONDI COMUNALI: **€ 197.819,41**

MUTUO: **€ 1.395.000,01**

TOT:  
**€ 4.604.304,86**



# IL PUNTO SUI CANTIERI

## 09. PALAZZO GIUSIANA

Recupero e rifunzionalizzazione dello storico Palazzo Giusiana, dei giardini e della sala cupola, finalizzato al potenziamento delle strutture sociali e culturali del territorio



- PROGETTO INTEGRATO (RUP-CMTO)
- SIAMO IN ATTESA DEL PROGETTO PFTE A SEGUITO DEL QUALE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA ELABORERA' IL PROGETTO ESECUTIVO
- CON CMTO STIAMO INTERLOQUENDO CON IL MINISTERO PER IL POSSIBILE RECUPERO DEL RIBASSO D'ASTA
- L'INTERVENTO NON È ANCORA PARTITO, MA LA FASE BUROCRATICO-AMMINISTRATIVA È IN VIA DI CHIUSURA. PROCEDURA COMPLESSA: LA PROPRIETÀ È COMUNALE, MA LA GARA È GESTITA DALLA CITTÀ METROPOLITANA



AVANZAMENTO LAVORI:

0%

TOT:  
€ 8.800.000,00

## IL PUNTO SUI CANTIERI

### 10. OSPEDALE DI COMUNITA'

Realizzazione di Ospedale di Comunita' in Corso Nigra 35 nell'ambito del progetto di rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia

AVANZAMENTO LAVORI

15%

- COSTO OPERA: **€4.800.000,00**
- INIZIO LAVORI: OTTOBRE 2024
- FARE IL PUNTO CON L'ASL, È PARTITO L'ITER DEL CANTIERE
- FINE LAVORI: GIUGNO 2026




## IL PUNTO SUI CANTIERI

### 11. SOSTITUZIONE PASSAGGI A LIVELLO

Intervento di soppressione dei passaggi a livello nell'ambito del progetto di potenziamento e velocizzazione della tratta Ivrea/Aosta (RFI)

RFI SOTTOSCRIVERÀ IL CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO PER I LAVORI ENTRO LUGLIO PER IL PASSAGGIO A LIVELLO DI S.BERNARDO. SONO PREVISTI CIRCA 3 MESI PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO E 4 MESI PER LA VERIFICA DEL PROGETTO, SUCCESSIVAMENTE VERRANNO AVVIATI I LAVORI CHE AVRANNO UNA DURATA PREVISTA DI CIRCA 18 MESI

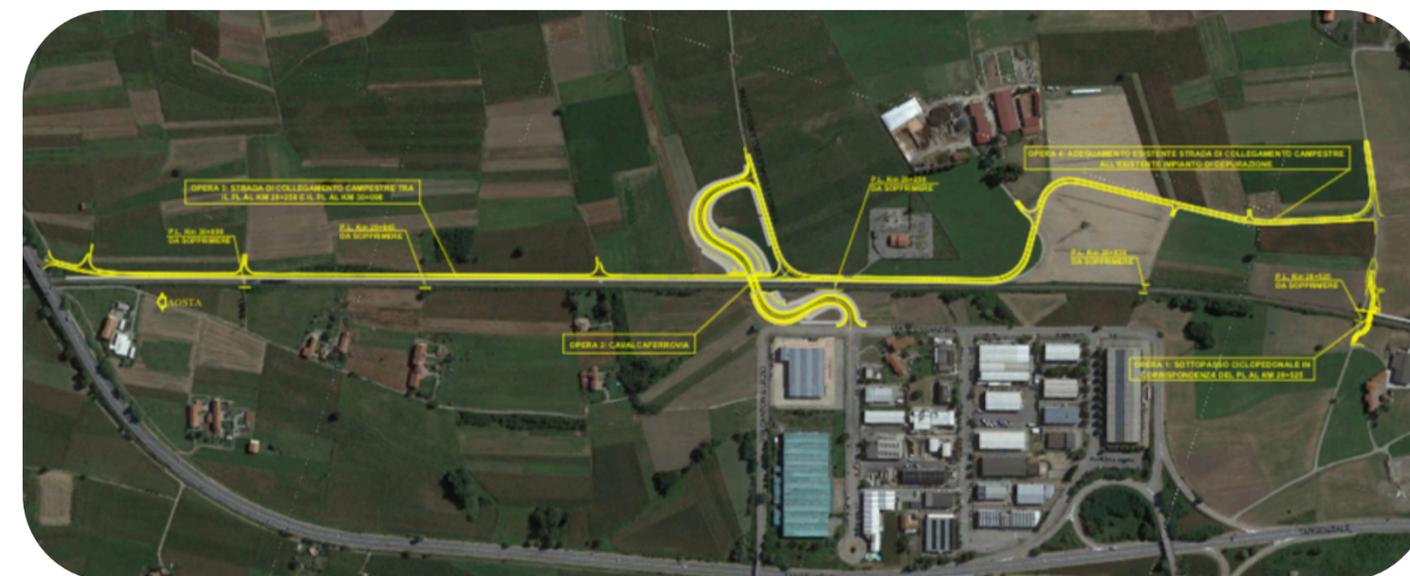



# IL PUNTO SUI CANTIERI

## 12. GALLERIA FERROVIARIA

Innalzamento della galleria ferroviaria lato corso Cavour innesto dal ponte sulla Dora Baltea, nell'ambito dell' elettrificazione della linea Ivrea/Aosta



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- LA PRIMA FASE INERENTE LA DEVIAZIONE PROVVISORIA DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI CON LA GALLERIA ARTIFICIALE SI È CONCLUSA A METÀ FEBBRAIO 2025. QUESTA FASE È DURATA PIÙ DEL PREVISTO A CAUSA DELLE PROBLEMATICHE DI SPOSTAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE FIBERCOP (EX TELECOM). OLTRE ALLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI, È STATA COMPLETATA LA DEVIAZIONE PROVVISORIA DELLA FOGNATURA E DELL'ACQUEDOTTO (SMAT), DELLA RETE GAS (RETI DISTRIBUZIONE) E DELLA LINEA A BASSA TENSIONE DI ENEL DISTRIBUZIONE.
- TERMINATA LA DEVIAZIONE PROVVISORIA DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI, SI È REALIZZATA UNA PRIMA PARATIA DI MICROPALI SUL LATO OVEST. SI È POI PROVVEDUTO ALLA DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE MURO DI VIA RIVA E ALL'INSTALLAZIONE DELLA SECONDA PARATIA DI MICROPALI SUL LATO EST (LATO CGIL). SI È POI PROVVEDUTO A SCOPRIRE LA GALLERIA ESISTENTE RIMUOVENDO IL TERRENO SOPRASTANTE.
- IN QUESTO MOMENTO SI STANNO PREDISPONENDO LE OPERE PROVVISORIALI INTERNO GALLERIA PER POI PROSEGUIRE CON LA DEMOLIZIONE DELLA PRIMA MACROFASE DELLA GALLERIA ARTIFICIALE IVREA. TALE DEMOLIZIONE POTRÀ AVVENIRE SOLO DOPO AVER RIMOSSO IL BINARIO PRESENTE, DEMOLIZIONE PREVISTA NELLA PRIMA PARTE DI GIUGNO 2025 PER MOTIVI LOGISTICI LEGATI ALL'ACCESSO DELLE FORNITURE DI ROTAIE NECESSARIE A RICOSTRUIRE I TRATTI DI BINARIO A MONTE DI IVREA.
- UNA VOLTA DEMOLITA LA GALLERIA, SI PROCEDERÀ CON LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA MACROFASE DELLA GALLERIA ARTIFICIALE, TERMINATA LA QUALE SI PROVVEDERÀ A RITOMBARE LA GALLERIA E A RIPOSIZIONARE I SOTTOSERVIZI NELLA LORO POSIZIONE DEFINITIVA. NEL FRATTEMPO, SI DEVIERÀ IL TRAFFICO DI CORSO CAVOUR SOPRA IL TRATTO DI GALLERIA COSTRUITA PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DEI MICROPALI, LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO RESTANTE PER FASI SUCCESSIVE. LA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA CAVOUR È PREVISTA INTORNO A NOVEMBRE-DICEMBRE 2025.
- IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER INIZIO ESTATE 2026.

TOT:  
**€ 19.849.361,00**

## PROGETTO ESECUTIVO DEMOLIZIONE EX CENA

Riqualificazione urbanistica dell'area su cui insiste il fabbricato in demolizione in vista della pianificazione del nuovo hub culturale

- LAVORI IN FASE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI BANDO DI GARA (HANNO PARTECIPATO 70 DITTE)
- APERTE LE BUSTE ECONOMICHE IL 22/05/2025



## SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE

Realizzato bagno disabili e nuovo impianto elettrico, installati alcuni nuovi sanitari, tinteggiatura completa e impermeabilizzazione copertura,

INIZIO LAVORI: **08/10/2024**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA: **€ 51.892,66**

**TERMINATO**

AVANZAMENTO LAVORI:

**100%**

## RELAMPING SCUOLE MASSIMO D'AZEGLIO E FIORANA

Interventi eseguiti:  
Rimozione plafoniere nei locali scolastici  
Rimozione dei proiettori nella palestra Jervis  
Smaltimento lampade rimosse  
Installazione di nuovi apparecchi illuminanti Led nelle strutture scolastiche  
Installazione di kit emergenza in alcune lampade  
Installazione nuovi proiettori Led nella palestra

INIZIO LAVORI: **13/09/2024**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA: **€ 77.385,75**

TERMINATI LAVORI PREVISTI, ULTERIORI LAVORAZIONE CON RECUPERO RIBASSO ED ECONOMIE IN PROGETTAZIONE

AVANZAMENTO LAVORI:

**95%**



# IL PUNTO SUI CANTIERI

## RELAMPING PARCHEGGIO MOVICENTRO


Sostituzione di 173 corpi illuminanti di cui 65 con kit di emergenza

• **TERMINATO**

Dispositivo	Quantità	Potenza	Ore utilizzo annuale	Consumo
[-]	[-]	[Watt]	[h]	[kWatt h]
BS100 LED REGOLABILE M1280 4K	173	53	6205	56.894
TOT. [kWatt h]				56.894
COSTO ENERGIA ELETTRICA ANNUALE POST RELAMPING				19.084,29 €
Dispositivo	Quantità	Potenza	Ore utilizzo annuale	Consumo
[-]	[-]	[Watt]	[h]	[kWatt h]
Vecchi led (potenza ipotizzata)	100	80	6205	49.640
Neon	73	116	6205	52.544
TOT. [kWatt h]				102.184
COSTO ENERGIA ELETTRICA ANNUALE POST RELAMPING				34.276,37 €
Risparmio annuale				15.192,08 €
Risparmio in percentuale				44%

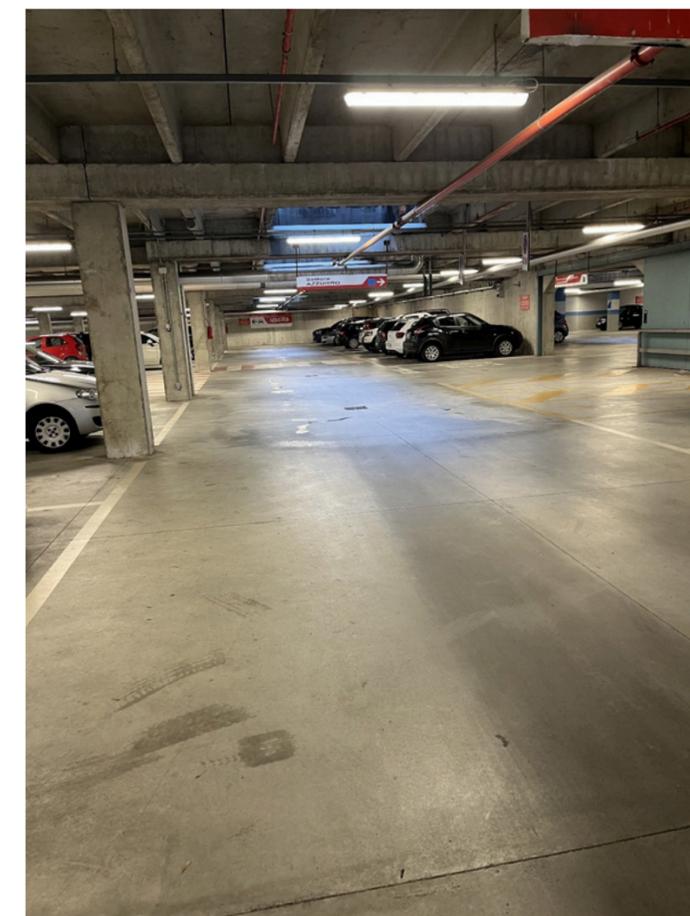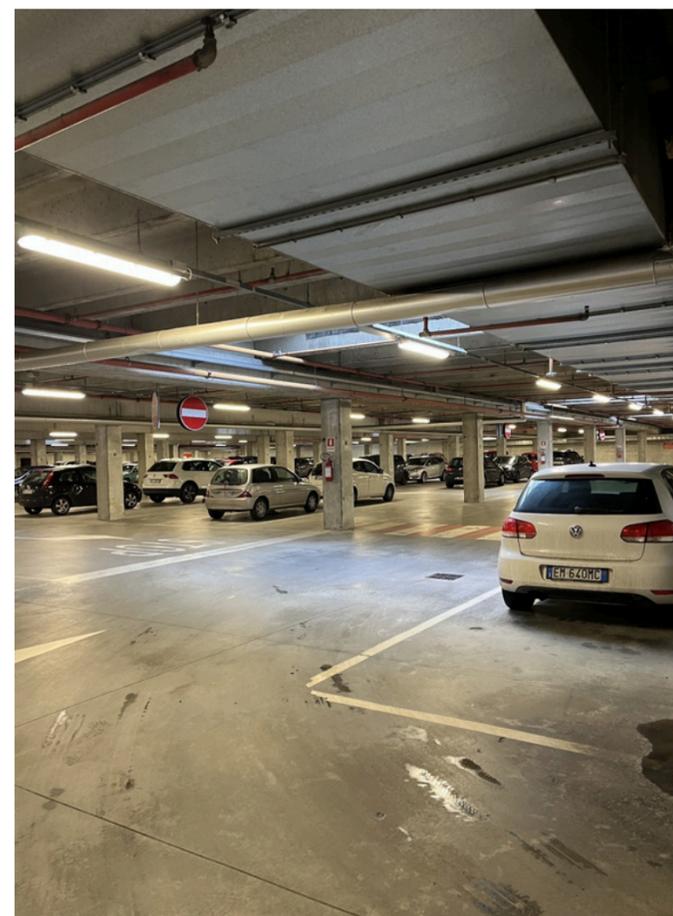

AVANZAMENTO LAVORI:



INIZIO LAVORI: **22/10/2024**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA: **€ 21.978,40**

# IL PUNTO SUI CANTIERI

## ASFALTATURA PIAZZA RONDOLINO

Completata l'asfaltatura del parcheggio in Piazza Rondolino, con miglioramento della superficie e ripristino della piena funzionalità dell'area di sosta.

• **TERMINATO**



AVANZAMENTO LAVORI:




# IL PUNTO SUI CANTIERI

## PIAZZETTA FIORANA

Riqualificazione area antistante alla scuola

• **TERMINATO**

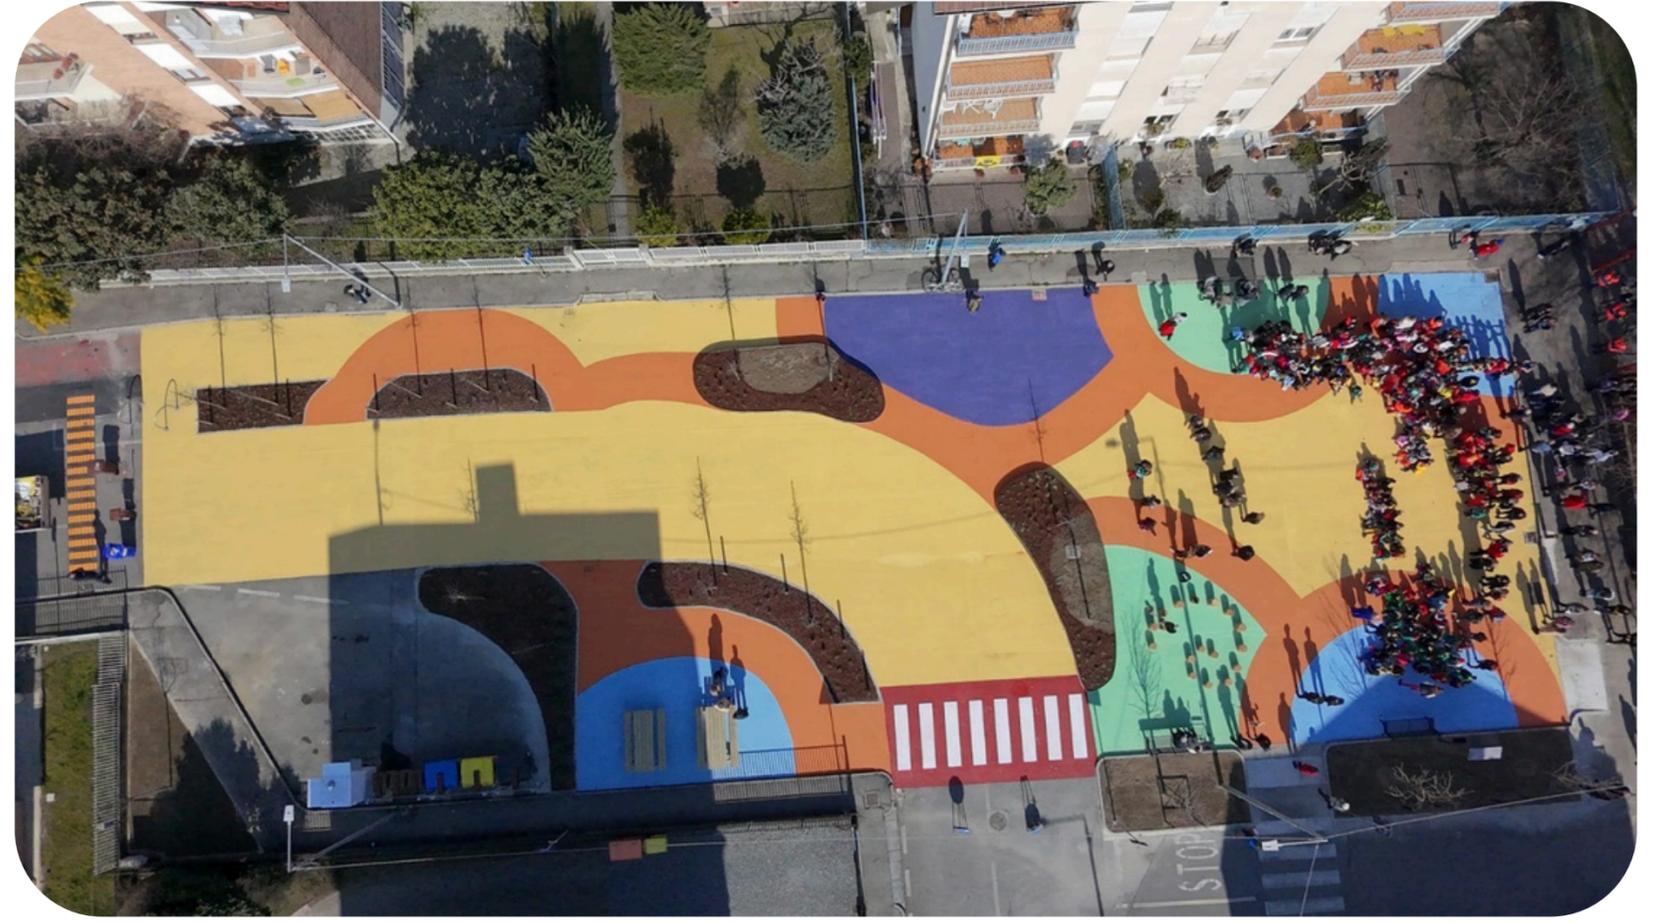

AVANZAMENTO LAVORI:



INIZIO LAVORI: **15/01/2025**

FINE LAVORI: **28/02/2025**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA:

**€ 66.224,57**

## ASFALTATURA VIA AOSTA + MASSIMOD'AZEGLIO

Intervento di sicurezza stradale con riasfaltatura di tratti di via Aosta e rifacimento della segnaletica orizzontale, per evidenziare l'attraversamento pedonale in corrispondenza della Clinica Eporediese.

INIZIO LAVORI: **23/04/2025**

FINE LAVORI: **31/03/2025**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSO IMPRESA:  
**€ 83.066,13**

**TERMINATO** AVANZAMENTO LAVORI:

**100%**

## SUA (PERCORSO VIA MONTENAVALE)

- IN ATTESA ASSEGNAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

## ANFITEATRO ROMANO

- AVVIATO UN PIANO DI VALORIZZAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI UNA CASA DEMANIALE, AFFIANCATO DA UN'IPOTESI PROGETTUALE SVILUPPATA DAL POLITECNICO PER L'INTEGRAZIONE CON LA RETE DELLE CICLOVIE

## MANUTENZIONE UNITÀ ABITATIVE PER RIASSEGNAZIONE

Manutenzione unità abitative di Via IV  
Martiri 41 - Via Marsala 20 - Via Arduino 109  
Verifica e sistemazione impianti,  
imbiancatura e controlli

INIZIO LAVORI: **27/01/2025**

FINE LAVORI: **12/03/2025**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA: **€ 35.475,00**

**TERMINATO** AVANZAMENTO LAVORI:

**100%**

## INTERVENTO SMAT VIA CANTON GABRIEL

INIZIO LAVORI: **18/01/2024**

FINE LAVORI: **30/09/2025**

IMPORTO CONTRATTO IVA ESCLUSA: **€ 1.4MLN**

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO: **€ 1.65 MLN**

AVANZAMENTO LAVORI:

**50%**



**IVREA**

***IN CORSO***

**IL PUNTO SUI CANTIERI ●**

**GRAZIE**

*L'amministrazione comunale della Città di Ivrea*
